


0 - Templates Ed Controls Bouwkundig


VGM startgesprek met Onderaannemer bij aanvang werkzaamheden op project

GROEP: START WERK-GESPREK

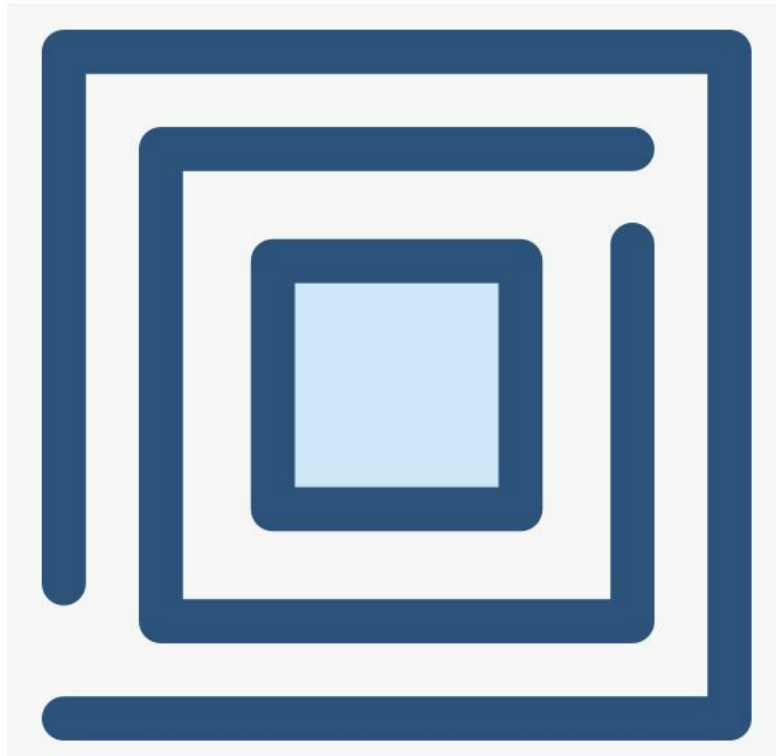

LOCATIE:
Deventer, Nederland

TEMPLATE ID: **04F1AF**

02 JUL 2024 16:37 
Robert Greidanus (Dutchview)

VGM startgesprek met Onderaannemer bij aanvang werkzaamheden op project

Algemeen

Onderaannemer

Telefoonnr;

De bouwpartner is uitgelegd wat de bedoeling is in Ed Controls, er is een oefenticket gemaakt waarbij het e-mail adres is toegevoegd als Verantwoordelijk in dit ticket. Er is ook een instructie gegeven hoe de Verantwoordelijke het ticket Gereed kan melden (zie ook de [video](#)).

Door u uit te voeren werkzaamheden;

Datum gesprek

Te bespreken onderwerpen

0. Het VGM plan uitvoeringsfase ligt ter inzage bij de Uitvoerder

1. Getekend contract aanwezig?

2. Is de VGM Verklaring Onderaannemer aanwezig? Zo nee; dan nu invullen. (tab. 1b)

3. Is het bedrijf waarbij u werkt VCA gecertificeerd?

4. U bent in het bezit van een geldige VCA certificaat (leidinggevende + ZZPers VCA-Vol). Voor aanvang werkzaamheden dienen u en uw werknemers dit te tonen aan de Uitvoerder.

5. Productie in relatie tot planning haalbaar?

6. Is de routing bekend?

7. Levering materialen / onderdelen (bekend wat, hoeveel, wanneer, leveren)?

8. Opslag / aanvoer van materiaal (hoe, wanneer, waar)

9. Bereikbaarheid van de locatie en terreinomstandigheden mbt uw materieel?

VGM startgesprek met Onderaannemer bij aanvang werkzaamheden op project

10. Parkeren op bouwwegen is verboden. (Aanrijd-) schade is niet verhaalbaar bij opdrachtgever.

11. Zijn uw meetinstrumenten aantoonbaar gekeurd / geijkt?

12. Uw medewerkers maken gebruik van uw eigen, aantoonbaar dmv sticker of label, gekeurde materieel zoals bv; Div. (elektrische-) gereedschappen en machines, trapjes / ladders, rolsteigers, enz., tbv de contractueel afgesproken werkzaamheden.

13. Afspraken over scheiden / afvoer afval bekend? Schoon erin Schoon eruit !

14. Wordt er door u ook personeel van derden ingezet? Zo ja, is dit schriftelijk gemeld bij de Projectleider?

15. Indien u personeel van buiten de EER inzet, voldoet u dan aan de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen?.

16. Spreken en begrijpen alle medewerkers de Nederlandse taal? Zo niet; dient de onderaannemer ervoor te zorgen dat er te allen tijde een vertaler aanwezig is.

Veiligheid / Gezondheid / Milieu:

17. Bent u bekend met de Algemene Project VGM-regels?

18. Heeft u kennis genomen van; Alarmkaart, Ziekenhuisroute en EHBO- / Blusmiddelen?

19. U zorgt ervoor dat u zich niet onder een te hijsen lasten bevindt en plaatst geen lichaamsdelen tussen de last en de ondergrond (knelgevaar)

20. Gebruikt u specifieke (hulp-) middelen om fysieke belasting te beperken? Zo niet, wat voor maatregelen treft u dan om te voldoen aan de wetgeving? Denk aan; Til niet meer dan 25 kg of samen 50 kg; Plaatmateriaal staand plaatsen,

21. Zijn uw boor-, zaag-, slijp-, schuur-, frees-, ... machines uitgevoerd met stofafzuiging?

22. Klimmaterieel; ladders en (A-)trap (zijn in principe geen werkplek). Gebruik alleen als; - het materieel aantoonbaar gekeurd is. (zie sticker met datum)- het veilig staat / opgesteld is en gebruikt kan worden (zie ook gebruiksaanwijzing op de boom van de trap/ladder) Mogelijk is gebruik van een rolsteiger als werkplek een optie?

23. (rol-)steiger veilig opbouwen en gebruiken; denk om max. vrijstaande hoogte binnen=12m /buiten=8m, verankeringen, voorloopleuningen, stabilisatoren, schoren, kantplanken, binnendoor beklimmen.

24. U gebruikt op juiste wijze de benodigde PBMs op dit project! (helm, (hand-) schoenen, stof-, zicht-, gehoorbescherming (>80dB=angeraden, 85dB of meer=verplicht))

25. Bij brandgevaarlijke werkzaamheden 2 x 12kg blussers + 2 blusdekens op de werkplek. Vul indien nodig Doc. 1g Brandgevaarlijke Werkzaamheden in. (tab. 1 uitv.map)

VGM startgesprek met Onderaannemer bij aanvang werkzaamheden op project

26. In voorkomende gevallen regels ten behoeve van omwonende. (bv radios, parkeren,...)

27. Indien uw werknemer een ongeval op de bouw overkomt, dient u dit per direct, dezelfde dag, te melden aan de Uitvoerder en een ingevuld incidentenrapport in te leveren. (Ermstige ongevallen dient u zelf binnen 24 uur te melden bij ISZW)

28. Het is verboden om steigerdelen, -verankeringen en/of leuning te verwijderen. Mits wel noodzakelijk dan iom de Uitvoerder met gebruik PBM en direct na de werkzaamheden terugplaatsen. De werkplek niet onbeheerd achterlaten zonder beveiliging!!

29. De steiger mag, van buitenaf maar ook vanuit het gebouw zelf, alleen betreden worden via de normale voorzieningen zijnde trappenhuizen en deuropeningen. (Niet door raamsparingen e.d.)

30. Werkzaamheden uitvoeren boven open dak- en vloersparingen / trapgaten is verboden. Deze dienen eerst te worden beveiligd met deugdelijk materiaal.

31. De onderaannemer zal met enige regelmaat controleren en erop toe zien dat zijn personeel de, door hem, verstrekte PBMs en machines juist gebruikt en de besproken punten naleeft en uitvoert zoals overeengekomen.

32. Afspraken over gebruik materieel door onderaannemer, bv; bouwlift, kraan,....

33. Bij gebruik van een door aannemer ter beschikking gestelde kraan, shovel e.d. moet u voor start werkzaamheden afspraken maken mbt communicatie/ aanwijzingen met de machinist

34. Bij gebruik van een kraan heeft uw medewerker bij voorkeur een certificaat mbt Aanslaan van lasten maar is tenminste door u aantoonbaar geïnstrueerd hoe lasten aangeslagen moeten worden.

35. Afspraken over afstemming van werkzaamheden tussen aannemer en onderaannemer Bv; bij onder- en boven elkaar werken, gelijktijdig op één plek werk uitvoeren,

Mogelijk wordt op dit bouwproject camerabewaking toegepast. Dit wordt aangegeven bij de entreepoort mbv een pictogram. De reden om cameras te plaatsen heeft voornamelijk te maken met Beveiligen van de Bouwlocatie. Beelden worden niet langer dan stikt noodzakelijk bewaard.

Bij het niet naleven van instructies of aanwijzingen kan door aannemer een sanctie worden opgelegd en mogelijk directe verwijdering van de bouw.

Voor aanvang van uw werkzaamheden de LMRA (=laatste Minuut Risico Analyse) uitvoeren !!!

Geïnformeerd

VGM startgesprek met Onderaannemer bij aanvang werk...

Template Id: [04F1AF](#)

Project: 0 - Templates Ed Controls Bouwkundig



GEMAAKT MET ED CONTROLS

